# APP ATLÉTICA PANTERAS NEGRAS

## Charter



2018/2

#### **ALUNOS**

Matheus Arcanjo - 1370481813033 Robson de Souza Conceição - 1370481813037

# Histórico das Revisões

Versão Número	Data	Descrição
1.0	15/10/2018	Descrição funcional do produto do projeto
1.1	22/10/2018	Elaboração do Business Drivers/Background
1.2	22/10/2018	Definição da Visão
1.3	29/10/2018	Criação do escopo WBS
1.4	12/11/2018	Apuração dos custos do projeto
1.5	12/11/2018	Organização do projeto
1.6	13/11/2018	Papéis da equipe e suas responsabilidades
1.7	13/11/2018	Criação da matriz de responsabilidades
1.8	25/11/2018	Descrição dos Custos (Rateio e Depreciação)
1.9	02/12/2018	Revisão dos custos e Planejamento dos riscos

### 1-Descrição do Projeto

Desenvolvimento de um aplicativo mobile, com o objetivo de preencher a lacuna de comunicação e informação entre alunos, atletas e parceiros com a Atlética Panteras Negras.

### 2-Business Drivers/Background

O problema que enfrentamos hoje é a falta de comunicação e informação dos alunos, atletas e parceiros com a Atlética Panteras Negras.

Sendo assim, iremos criar um meio que promoverá a comunicação e trará as informações necessárias para o estreitamento dessa relação, divulgando eventos, produtos, competições, ações sociais, captando patrocinadores e parceiros, integrando os calouros e veteranos, promovendo o esporte e o crescimento da atlética.

Aplicativos já existentes e próximos a proposta do projeto:


Atlética FEG: <a href="http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/atletica-fegunesp">http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/atletica-fegunesp</a>
Atlética ESPM: <a href="http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/atletica-metralha">http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/atletica-metralha</a>
Atlética UFAC: <a href="http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/sinistra-medicina-ufac-metralha">http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/sinistra-medicina-ufac-metralha</a>

#### 3-Visão

Promover o esporte, integração dos alunos, captação de patrocinadores e parceiros e divulgação de eventos e consequentemente, o crescimento da Atlética Panteras Negras.

# 4-Objetivos e Metas

### 4.1 - Diagrama do projeto

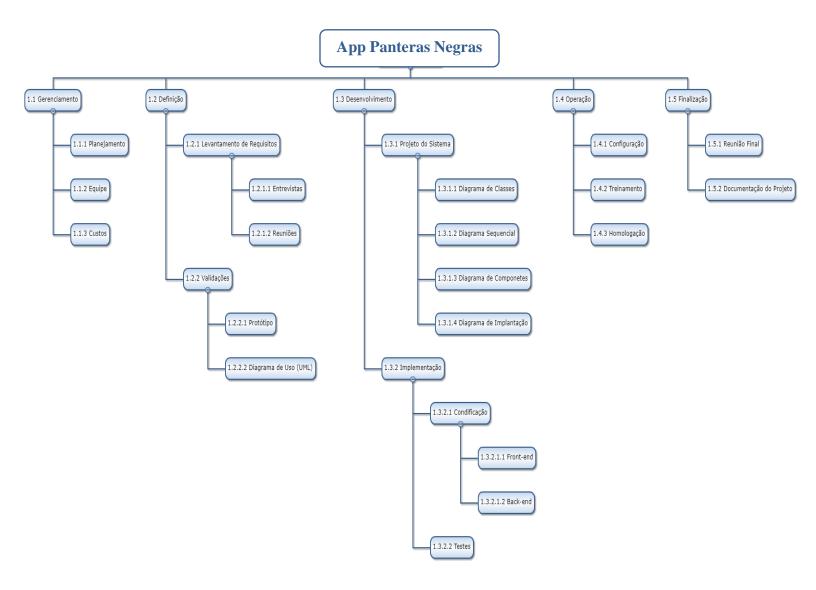

www.wbstool.com

## 4.2 - In scope

#### 1 APP PANTERAS NEGRAS

- 1.1 Gerenciamento
  - 1.1.1 Planejamento
  - 1.1.2 Equipe
  - **1.1.3 Custos**
- 1.2 Definição
  - 1.2.1 Levantamento de Requisitos
    - 1.2.1.1 Entrevistas
    - 1.2.1.2 Reuniões
  - 1.2.2 Validações
    - 1.2.2.1 Protótipo
    - 1.2.2.2 Diagrama de Uso (UML)
- 1.3 Desenvolvimento
  - 1.3.1 Projeto do Sistema
    - 1.3.1.1 Diagrama de Classes
    - 1.3.1.2 Diagrama Sequencial
    - 1.3.1.3 Diagrama de Componentes
    - 1.3.1.4 Diagrama de Implantação
    - 1.3.2 Implementação
    - 1.3.2.1 Condificação
      - 1.3.2.1.1 Front-end
      - 1.3.2.1.2 Back-end
      - 1.3.2.2 Testes
- 1.4 Operação
  - 1.4.1 Configuração
  - 1.4.2 Treinamento
  - 1.4.3 Homologação
- 1.5 Finalização
  - 1.5.1 Reunião Final
- 1.5.2 Documentação do Projeto

# 4.3 – Tabela de áreas, atividades, prazos e valores do projeto

		TABELA DE ATIVIDA	ADES - OBJE	TIVOS E METAS X CUS	<b>БТО</b>		
OP.	TAREFA	RESPONSÁVEL	HORAS	INÍCIO	FIM		VALOR
2	PLANEJAMENTO	GERENTE	2 hrs	07/01/2019 08:00	07/01/2019 10:00	R\$	300,00
AMEN	EQUIPE	GERENTE	8 hrs	07/01/2019 10:00	07/01/2019 18:00	R\$	1.200,00
GERENCIAMENTO	CUSTOS	GERENTE	8 hrs	08/01/2019 08:00	08/01/2019 16:00	R\$	1.200,00
GE	3 Atividades	1 Responsável	18 hrs	07/01/2019 08:00	08/01/2019 16:00	R\$	2.700,00
	ENTREVISTA	ANALISTA	12 hrs	09/01/2019 08:00	10/01/2019 10:00	R\$	1.200,00
Ş	REUNIÃO	ANALISTA	2 hrs	10/01/2019 10:00	10/01/2019 12:00	R\$	200,00
DEFINIÇÃO	PROTÓTIPO	DESIGNER	16 hrs	10/01/2019 12:00	14/01/2019 18:00	R\$	1.200,00
DE	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	ANALISTA	8 hrs	15/01/2019 08:00	15/01/2019 16:00	R\$	800,00
	4 Atividades	2 Responsáveis	38 hrs	09/01/2019 08:00	15/01/2019 16:00	R\$	3.400,00
	DIAGRAMA DE CLASSES	ANALISTA	8 hrs	15/01/2019 16:00	16/01/2019 12:00	R\$	800,00
	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	ANALISTA	4 hrs	16/01/2019 12:00	16/01/2019 16:00	R\$	400,00
OTN	DIAGRAMA DE COMPONENTES	ANALISTA	4 hrs	16/01/2019 16:00	17/01/2019 10:00	R\$	400,00
DESENVOLVIMENTO	DIAGRAMA DE IMPLEMENT.	ANALISTA	4 hrs	17/01/2019 10:00	17/01/2019 14:00	R\$	400,00
INVOI	FRONTEND	DESIGNER	16 hrs	17/01/2019 14:00	21/01/2019 10:00	R\$	1.200,00
DESE	BACKEND	PROGRAMADOR	80 hrs	21/01/2019 10:00	31/01/2019 10:00	R\$	4.000,00
	TESTES	TESTER	16 hrs	31/01/2019 10:00	01/02/2019 16:00	R\$	1.440,00
	7 Atividades	4 Responsáveis	132 hrs	15/01/2019 16:00	01/02/2019 16:00	R\$	8.640,00
	CONFIGURAÇÃO	ANALISTA	8 hrs	04/02/2019 08:00	04/02/2019 16:00	R\$	800,00
AÇÃO	TREINAMENTO	GERENTE	8 hrs	04/02/2019 16:00	05/02/2019 14:00	R\$	1.200,00
OPER/	HOMOLOGAÇÃO	PROGRAMADOR	40 hrs	06/02/2019 08:00	12/02/2019 18:00	R\$	2.000,00
	3 Atividades	3 Responsáveis	56 hrs	04/02/2019 08:00	12/02/2019 18:00	R\$	4.000,00
ÃO	REUNIÃO FINAL	GERENTE	2 hrs	13/02/2019 08:00	13/02/2019 10:00	R\$	300,00
CONCLUSÃO	DOCUMENTAÇÃO PROJETO	GERENTE	4 hrs	13/02/2019 10:00	13/02/2019 14:00	R\$	600,00
00	2 Atividades	1 Responsável	6 hrs	13/02/2019 08:00	13/02/2019 14:00	R\$	900,00
т.	19 Atividades	11 Responsáveis	250 hrs	07/01/2019 08:00	13/02/2019 14:00	R\$	19.640,00

#### 4.3 - CUSTOS DO PROJETO

## 4.3.1 - Mapa de Depreciação

	TABELA DE DEPRECIAÇÃO							
ITEM (QUANTIDADE)	ACQUISIÇÃO (PO	R ITEM)	TAXA ANUAL	TAXA MENSAL	ANOS	MESES	VALOR MENSAL DE DEPRECIAÇÃO	VALOR DEPRECIÁVEL
NOTBOOK (5)	R\$ 4.	.000,00	20%	1,67%	5	60	R\$ 66,67	R\$ 3.933,33
SMATPHONE (3)	R\$	800,00	0%	0,00%	0	0	R\$ -	R\$ 800,00
IMPRESSORA (1)	R\$ 1.	.500,00	20%	1,67%	5	60	R\$ 25,00	R\$ 1.475,00
MONITOR (2)	R\$ 1.	.200,00	20%	1,67%	5	60	R\$ 20,00	R\$ 1.180,00
				TOTAL DEPRECIÁVEL	(TODOS ITENS)	R\$ 398,33	000000000000000000000000000000000000000	

### 4.3.2 - Mapa de Custos com acomodação

	TABELA DE CUSTO - COWORKING				
VILADE	QUANTIDADE DE HORAS	VALOR P/ HORA	TOTAL		
NEGOCIOS Coworking	250 hrs	R\$ 70,00	R\$ 17.500,00		

## 4.3.2 - Mapa de Custos por categoria profissional

TABELA DE CUSTO - POR RESPONSÁVEL						
RESPONSÁVEL	QUANTIDADE DE HORAS	٧	ALOR HORA	TOTAL		
GERENTE	32 hrs R\$ 150,00 F		R\$	4.800,00		
ANALISTA	50 hrs	R\$	100,00	R\$	5.000,00	
TESTER	16 hrs	R\$	90,00	R\$	1.440,00	
DESIGNER	32 hrs	R\$	75,00	R\$	2.400,00	
PROGRAMADOR	120 hrs	R\$	50,00	R\$	6.000,00	
TOTAL	250 hrs	R\$	465,00	R\$	19.640,00	

#### 4.3.4 - Mapa geral de Custos

TABELA DE CUSTO	TABELA DE CUSTO - TOTAL						
ITEM	тот	ΓAL					
COWORKING	R\$	17.500,00					
MÃO DE OBRA	R\$	19.640,00					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.250,00					
ALMOÇO	R\$	3.700,00					
TRANSPORTE	R\$	1.480,00					
DEPRECIAÇÃO	R\$	398,33					
SERVIÇO DE BACKUP - FREE	R\$	-					
CLOUD AMAZON - FREE	R\$	-					
TOTAL	R\$	43.968,33					

# 5 - Organização do Projeto

#### 5.1 - Papeis e Responsabilidades

Sponsors do Projeto:

Nomes: Matheus Arcanjo e Robson Souza

E-mail: sponsors@atleticazs.com Nível de Responsabilidade: Alta

Tarefas: Administração do Projeto e realização de reuniões com patrocinadores

e stakeholders.

Gerente do Projeto: Nome: Ronaldo Nazário

E-mail: rnazario@tecnologia.com Nível de Responsabilidade: Alta

Tarefas: Gerenciar as tarefas e as equipes respectivamente responsáveis, de

modo a garantir a entrega do produto final.

**Descrição detalhada:** Gerenciar e controlar as entregas do projeto, elaborando o planejamento do projeto, definindo a equipe que atuará e os custos envolvidos, realizando reuniões de alinhamento com o cliente e equipe, sendo consultado a respeito do protótipo, testes, configurações e demais necessidades, aprovando a homologação, treinamento e documentação final.

#### Analista do Projeto: Nome: Josué da Silva

E-mail: jdasilva@tecnologia.com Nível de Responsabilidade: Alta

**Tarefas:** Realizar o levantamento dos requisitos necessários para o desenvolvimento do projeto, bem como procurar no mercado desenvolvedores e designers que tenham o perfil necessário para a criação e homologação da

aplicação.

**Descrição detalhada:** Gerenciar e coordenar o desenvolvimento. Sendo responsável pela elaboração dos diagramas, entrevista dos envolvidos, elaboração do treinamento, homologação e documentação final do aplicativo.

### Programador do Projeto:

Nome: Chico Gunha da Silva

**E-mail**: cgunhadasilva@tecnologia.com **Nível de Responsabilidade**: Média – Alta

**Tarefas:** Desenvolver o back-end da aplicação de maneira organizada e diretamente compreensível pelo front-end developer; além de realizar a tarefa de homologação da aplicação junto a um cliente pré-selecionado.

**Descrição detalhada**: Desenvolver o código back-end, participar de reuniões, sessões de testes e configuração do aplicativo.

#### Designer do Projeto:

Nome: Wenceslaw Mineiro

E-mail: wmineiro@tecnologia.com Nível de Responsabilidade: Média

**Tarefas:** Criar o front-end da aplicação de forma limpa e de fácil compreensão, utilizando recursos de UX design e UI design, de maneira a entregar ao cliente final uma interface leve e de fácil utilização.

**Descrição detalhada:** Planejar e desenvolver o layout do software, participar de reuniões de alinhamento com o cliente e equipe, dando o suporte necessário as demais tarefas.

#### Tester do Projeto:

Nome: Washington Machado

E-mail: wmachado@tecnologia.com Nível de Responsabilidade: Média

**Tarefas:** Realizar testes na aplicação, visando encontrar possíveis falhas residuais que necessitem correção, além de realizar relatórios sobre os testes de cada build e encaminha-los aos desenvolvedores.

Descrição detalhada: Testar o software e reportar as necessidades a serem corrigidas, participar de reuniões de alinhamento com o cliente e equipe, dando o suporte necessário as demais tarefas.

# 5.2 - Matriz de Responsabilidades

	MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - POR FUNÇÃO								
NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	PLANEJAMENTO	GESTÃO	ESCOPO	EXECUÇÃO	VALIDAÇÃO			
RONALDO NAZÁRIO	GERENTE	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL	PARTICIPA	APROVA			
JOSUÉ DA SILVA	ANALISTA	SUPORTE	SUPORTE	CONSULTADO	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL			
WASHINGTON MACHADO	TESTER	INFORMADO	INFORMADO	INFORMADO	PARTICIPA	SUPORTE			
WENCESLAW MINEIRO	DESIGNER	INFORMADO	INFORMADO	INFORMADO	SUPORTE	SUPORTE			
CHICO GUNHA DE SOUZA	PROGRAMADOR	CONSULTADO	CONSULTADO	CONSULTADO	PARTICIPA	SUPORTE			

	MATRIZ DE RE	SPONSABILIDADE -	POR ATIVIDADE		
ATIVIDADES	GERENTE	ANALISTA	TESTER	DESIGNER	PROGRAMADOR
PLANEJAMENTO	RESPONSÁVEL	SUPORTE	PARTICIPA	PARTICIPA	PARTICIPA
EQUIPE	RESPONSÁVEL	SUPORTE	PARTICIPA	PARTICIPA	PARTICIPA
CUSTOS	RESPONSÁVEL	SUPORTE			
ENTREVISTA	PARTICIPA	RESPONSÁVEL			
REUNIÃO	RESPONSÁVEL	SUPORTE	PARTICIPA	PARTICIPA	PARTICIPA
PROTÓTIPO	CONSULTADO	APROVA		RESPONSÁVEL	
DIAGRAMA DE CASO DE USO (UML)		RESPONSÁVEL			
DIAGRAMA DE CLASSES		RESPONSÁVEL			
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA		RESPONSÁVEL			
DIAGRAMA DE COMPONENTES		RESPONSÁVEL			
DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO		RESPONSÁVEL			
CODIFICAÇÃO FRONT-END		APROVA	SUPORTE	RESPONSÁVEL	PARTICIPA
CODIFICAÇÃO BACK-END		APROVA	SUPORTE		RESPONSÁVEL
TESTES	CONSULTADO	APROVA	RESPONSÁVEL		PARTICIPA
CONFIGURAÇÃO	CONSULTADO	RESPONSÁVEL	SUPORTE		PARTICIPA
TREINAMENTO	APROVA	RESPONSÁVEL			
HOMOLOGAÇÃO	APROVA	RESPONSÁVEL			
REUNIÃO FINAL	RESPONSÁVEL	SUPORTE	PARTICIPA	PARTICIPA	PARTICIPA
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO	APROVA	RESPONSÁVEL	SUPORTE	PARTICIPA	PARTICIPA

## 6-Escopo

Para esta primeira fase do APP estão previstos os seguintes módulos:

- 1. Segurança (Gestão de acessos, perfis, usuários)
  - 1.1. Cadastro de usuários
  - 1.2. Cadastro de perfis de acesso
- 2. Atletas
  - 2.1. Cadastro de Atletas
  - 2.2. Controle de presença
- 3. Desporto
  - 3.1. Cadastro de Modalidades
  - 3.2. Cadastro de Equipes
- 4. Eventos
  - 4.1. Cadastro de Eventos
  - 4.2. Agenda
- 5. Contato
  - 5.1. Formulário

### 7- Riscos

#### 7.1 - Matriz de Riscos

		PROBABILIDADE					
	ALTO	ALTO	ALTO	MÉDIO			
I M				1,2			
P	MÉDIO	ALTO	MÉDIO	BAIXO			
A C			4,5,6,7,14	3			
T O	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	BAIXO			
			13	1,2			

# 7.2 – Mapa estratégico de Riscos

	MAPA ESTRATÉGICO DE RISCOS						
RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	ESTRATÉGIA/AÇÃO A SER TOMADA				
			MANTER PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS ATRATIVOS;				
		000000000000000000000000000000000000000	BOM AMBIENTE DE TRABALHO;				
	Aug for the land and a sufficient	Di	BOM INTER-RELACIONAMENTO;				
1	Ausência/abandono de profissionais	Risco baixo	MANTER POLÍTICA EFICIENTE DE BACKUP;				
		000000000000000000000000000000000000000	DOCUMENTAÇÃO DETALHADA;				
			MANTER REUNIÕES PERIÓDICAS DE ALINHAMENTO				
_		Disease basis	CONTRATAR PROFISSIONAIS DE CONSULTORIAS;				
2	Profissional com desconhecimento técnico	Risco baixo	EXIGIR REQUISITOS E PORTIFÓLIO PROFISSIONAL;				
_			ADVERTÊNCIA AO PROFISSIONAL;				
3	Profissional não corporativo	Risco médio	SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE PERSISTÊNCIA;				
4	Falha de energia constante	Risco médio	TROCA DE LOCAL (COWORK);				
_			TROCA DE LOCAL (COWORK);				
5	Falha de internet constante	Risco médio	MANTER PLANO DE INTERNET PARA GESTORES;				
	6 Tecnologia escolhida não está adequada ao projeto	S: / I:	IDENTIFICAR ALTERNATIVA, AVALIAR IMPACTOS DA TROCA DA TECNOLOGIA;				
ь		Risco médio	IDENTIFICAR RECURSOS CAPACITADOS				
7	Perda de informação e dados	Risco médio	USO DE DADOS EM NUVEM;				
		Risco baixo	ANÁLISE DA REAL NECESSIDADE DAS MUDANÇAS;				
8	Mudança no escopo		ANÁLISE DE CUSTOS E TEMPO;				
			USO DE ANTIVÍRUS ATUALIZADOS;				
9	Vírus nos computadores	Risco baixo	MANTER POLÍTICA EFICIENTE DE BACKUP;				
		000000000000000000000000000000000000000	DESENVOLVIMENTO EM NUVEM				
40	Deable and the state of the sta	Diago baiya	ACIONAMENTO DE GARANTIA;				
10	Problemas técnicos (hardware)	Risco baixo	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA;				
11	Indisponibilidade do local do projeto	Risco baixo	TRABALHO HOME OFFICE;				
			CONVERSA INDIVIDUAL;				
12	Desentendimento na equipe	Risco médio	REUNIÕES PARA APROXIMAÇÃO DE EQUIPE;				
		рановичения	MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO;				
			BACKUP ATUALIZADO DOS DADOS EM NUVEM				
13	Assalto/Roubo de equipamentos	Risco baixo	ACIONAR A SEGURADORA DO PRÉDIO;				
13	Assaito, nouse de equipamentos	INISCO DAIXO	AVALIAR PERDAS E ACIONAR RESPONSÁVEIS				
			FAZER REGISTRO POLICIAL				
	1						
		0000000000	MANTER POLÍTICA DE SENHAS E ACESSOS;				
14	Ataques cibernéticos	Risco Alto	MANTER POLITICA DE SENHAS E ACESSOS;  MANTER EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS;				
